

DZPiZ-267/2018

Warszawa, dnia 06.08.2018 r.

WYKONAWCY

*Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na:
„Remont korytarza na parterze w budynku D wraz z modernizacją pomieszczeń Pracowni
Endoskopii prowadzony w ramach zadania inwestycyjnego pt.: "Przebudowa i modernizacja
Szpitala Czerniakowskiego" zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją" (nr sprawy 67/2018).*

Działając na podstawie 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania prac z 09.11.2018 do 10.12.2018 r. Wynika to z okresu oczekiwania na zamówienie i dostarczenie stolarki drzwiowej, opóźnień wynikających z braku możliwości zamknięcia korytarza przy Endoskopii oraz prawidłowego wykonania pozostałych prac budowlanych.

Odpowiedź Nr 1:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji i wprowadza zmianę zapisu rozdz. I ust. 2 pkt. 2.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 07.12.2018 r.”.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany § 4 ust. 1 „Termin realizacji umowy” w załączniku nr 4 do SIWZ „Projekt umowy”, który otrzymuje brzmienie:

„Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 07.12.2018 r.”

Pytanie nr 2

Nawiązując do przetargu 41/2018 i powtórki 65/2018 proszę o informację czy budżet Zamawiającego przeznaczony na tą inwestycję w dalszym ciągu jest na poziomie 475 023,29 pln brutto?

Odpowiedź Nr 2:

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza podwyższenie budżetu poprzez indeksację cen materiałów budowlanych i usług zgodnie z 3 i 4 kwartałem br. ?



Odpowiedź Nr 3:

Zamawiający przewidział w SIWZ i projekcie umowy wynagrodzenie ryczałtowe. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia ofertowego (wynagrodzenie ryczałtowe), jaką Wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie koszty i okoliczności, które towarzyszą lub mogą towarzyszyć wykonaniu tego zamówienia i które są konieczne dla prawidłowej realizacji tego zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności: koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem, koszty robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy, koszty innych prac określone w Projekcie umowy oraz w dokumentacji technicznej, koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i kierowników robót; koszty zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania robót budowlanych przez uprawnionego geodetę; koszty tyczenia geodezyjnego obiektów w terenie, *jeżeli dotyczy przedmiotu zamówienia*; koszty wykonania niwelacji terenu, *jeżeli dotyczy przedmiotu zamówienia*; koszty wykonania dokumentacji powykonawczej; podatek VAT. Zamawiający nie przewiduje indeksacji.

Pytanie nr 4

Czy na podstawie Art. 31a PZP Zamawiający przewiduje rozpoczęcie dialogu technicznego – drugie rozpięcie przetargu nie przyniosło wyników pozytywnych?

Odpowiedź Nr 4:

NIE, Zamawiający nie przewiduje.

Pytanie nr 5

Czy na podstawie art. 30 ust. 4 PZP Zamawiający dopuści gotowe produkty medyczne krajowego producenta firmy AwaMed Medizintechnik jako równoważne?

W załączeniu przesyłam karty katalogowe naszych gotowych produktów medycznych klasy IIb tablice podtynkowe dla gazów medycznych.

Odpowiedź Nr 5:

Zamawiający dopuszcza przedstawione w kartach katalogowych produkty w systemie AGA i w zakresie przewidzianym w przedmiarze robót.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający zapewni bez obostrzeń dostęp do pomieszczeń modernizowanych, media oraz wjazd i parking dla pracowników budowlanych wraz ze sprzętem?

Odpowiedź Nr 6:

Zamawiający wskazał w SIWZ i projekcie umowy, iż Wykonawca, realizując przedmiot zamówienia zobowiązany będzie do prowadzenia robót w czasie funkcjonowania obiektów (na czynnym obiekcie Szpitalnym), a tym samym zobowiązany będzie do oznaczenia miejsc prowadzenia robót i zachowania wszelkiej ostrożności i zasad bhp i ppoż. Zamawiający nie zabezpiecza miejsca magazynowania materiałów i urządzeń Wykonawcy na terenie Szpitala.



Wszelkie prawa i obowiązki Wykonawcy, Zamawiający opisał w § 7 Projekt umowy „Prawa i obowiązki stron”. Wyraźnie wskazano, iż do obowiązków Wykonawcy, poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, należy w szczególności: „(...) zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż.; ponoszenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy; utrzymanie ład i porządku na terenie robót, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania.”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający tj. Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 00-739) przy ul. Stępińskiej 19/25 **dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu** zamieszczonego w BZP w dniu 21/08/2018 roku pod numerem 606442-N-2018. – Termin realizacji zamówienia.

Nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Damian Rączkowski
PROKURENT
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

dr u. med. Jarosław Ucieklak

Przygotowała: Anna Nyrek-Koczkodaj

Dział Zarządzania Pielęgniarstwem i Zmopatrzenia
KIEROWNIK

Anna Nyrek-Koczkodaj

TABLICE POBORU PODTYNKOWE

Funkcje:


- Tablice podtynkowe służą jako obudowa zewnętrzna punktów poboru gazów medycznych i próżni w systemie AGA lub DIN przy połączeniu z jednostkami końcowymi systemów rurociągowych.
- Szybkie i bezawaryjne odłączanie i podłączanie się od systemów zasilanych gazami i próżnią.
- Zapobiega przedostawaniu się cząstek stałych z instalacji do urządzeń odbierających gazy oraz do instalacji centralnej próżni.

Montaż:


- Tablica podtynkowa jest mocowana do ściany pod tynkiem tak, że punkty poboru nie wystają ponad ścianę a są z nią zlicowane.

Parametry techniczne:


- ciśnienie wejściowe min. 4,0 - 5,0 barów dla gazów medycznych,
- podciśnienie dla próżni $\leq -0,6$ bar,
- punkty dostępne dla następujących gazów:
 - tlen,
 - sprężone powietrze,
 - podtlenek azotu,
 - dwutlenek węgla,
- budowa w oparciu o materiały kompatybilne z tlenem zgodnie z PN-EN ISO 15001.

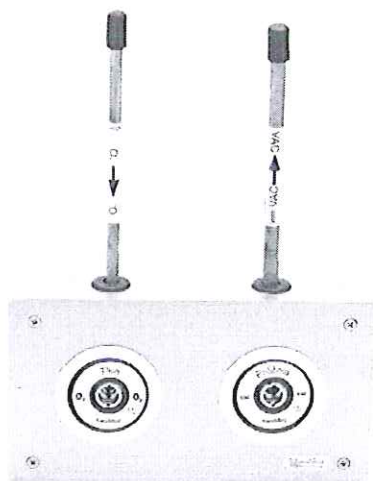


Tablica poboru AGA dla 2 gazów

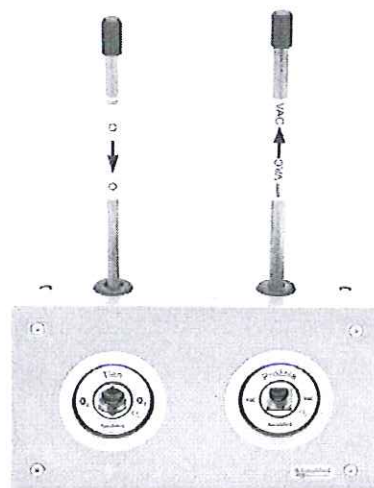

Tablica poboru DIN dla 2 gazów

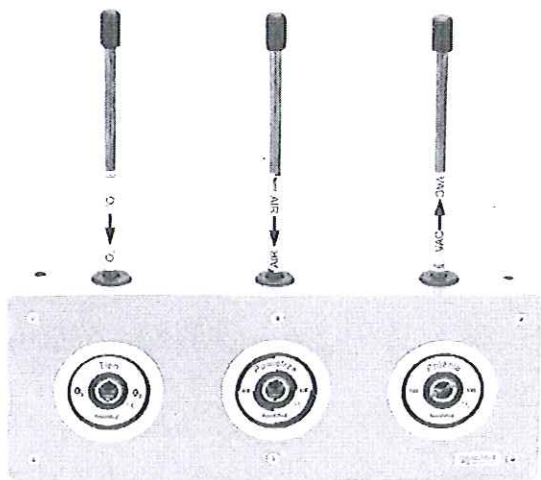


Tablica poboru AGA dla 3 gazów

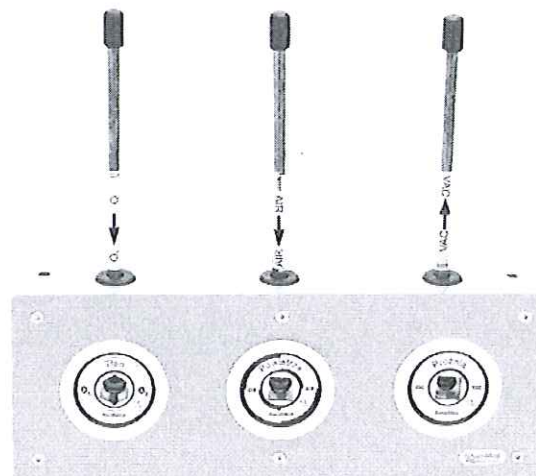

Tablica poboru DIN dla 3 gazów

TABLICE POBORU PODTYNKOWE

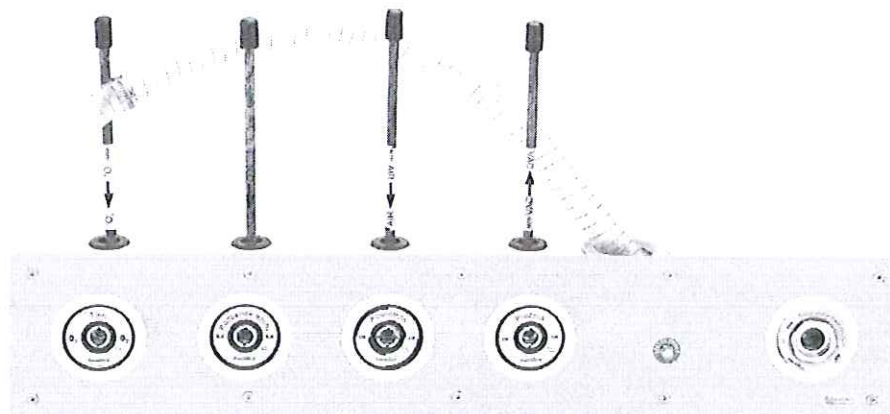

Tablica poboru AGA dla 4 gazów plus odciąg AGSS DIN II

SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIENI

Konfiguracja punktów poboru, ich rodzaj i ilość zależą od potrzeb zamawiającego, który określa w 3 krokach



sposób oprawy
- tablica poboru podtynkowa
- tablica poboru nadtynkowa



liczbę i rodzaj gazów medycznych
- tlen
- podtlenek azotu
- sprężone powietrze
- próżnia
- odciąg AGSS DIN I
- odciąg AGSS DIN II



rodzaj punktu poboru
- DIN
- AGA
- AGA ZTM
- odciąg AGSS
- punkt poboru AIR MOTOR

Przykładowe zamówienie: Tablica podtynkowa DIN dla 3 gazów [Tlen, Tlen, Próżnia] + AGSS DIN I

AwaMed[®]
Medizintechnik

AWAMED Medizintechnik Arkadiusz Warzyński
Dział Handlowy TEL. 91 4876849 I
ul. Zeusa 1; 72-006 Mierzyn; www.awamed.pl



awamed@awamed.pl
www.awamed.pl



tel. 91 48 76 849

14 lat
doświadczenia

20 osób
w zespole

50
instalacji rocznie

200
produktów
